



# Leverandørgruppemøde

---

Diagnosekort i almen praksis

Onsdag den 2. juni 2021



# Dagsorden

- Kl. 14:00-14:10    **Siden sidst** – v. MedCom
- Status på pilotdeltagende - klinikker og patienter.
- Kl. 14:10-15:00    **Kort status fra pilotleverandører til diagnosekortet**
- Udrulning af diagnosekortet og evt. første respons – v. LPS
  - PLSP-snitflader – v. PLSP
  - Tidsplan for MinLæge – v. PLO/Virgilerne
- Kl. 15:00-15:30    **Tidsplan for pilotafprøvning** – v. fælles dialog
- Er der behov for justeringer af tidsplanen?
  - Er det evt. muligt at forlængelse pilotafprøvning til august?
- Kl. 15:30-16:00    **Eventuelt og næste møde**
- Ønske om at modtage LPS udsendte Diagnosekortvejledninger.

# Status på deltagende pilotklinikker og patienter

## NOVAX (Release 27. maj)


- Lægerne Amagerbrogade 172 (+ptt.)
- Lægerne Fisketorvet 6. sal (+ptt.)

## WinPLC (Release 2. og 3. juni)

- Lægeklinikken Frederikshavn (+ptt.)
- Mit Lægehus Rødovre
- Citydoctors

## XMO (Release 4. juni)

- Lægehuset Bondovej
- Lægehuset Dagmar i Ringsted

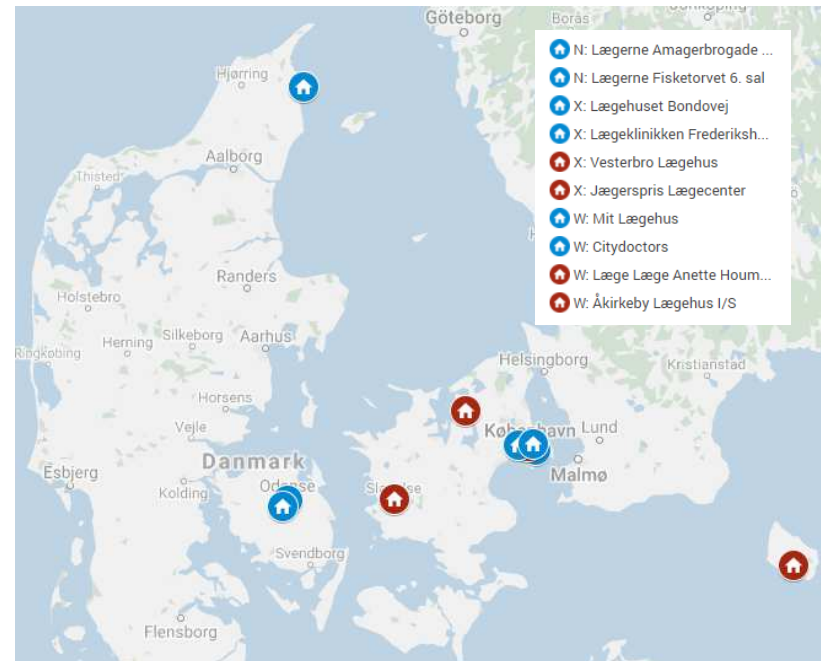

Blå = deltager. Rød = deltager ikke.

# Kort status fra pilotleverandører til diagnosekortet

- Udrulning af diagnosekortet og evt. første respons – v. LPS
- PLSP-snitflader – v. PLSP
- Tidsplan for MinLæge –v. PLO/Virgilerne

# Tidsplan for pilotafprøvning - pr. 07.05.2021

2021	April				Maj				Juni				Juli				August				
Aktivitet/uge	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34
<b>Plan pilotafprøvning</b>														<b>Sommerferie</b>							
Pilotudvikling LPS og PLSP																					
Pilotudvikling Min Læge																					
Indgå aftale med pilotklinikker																					
Egen test Asynkron uploadtest (LPS)																					
Introduktion for pilotklinikker																					
Pilotafprøvning (fase 1) Diagnosekort i praksis																					
Anonymiseret patientdata Downloadtest (ML)																					
Pilotafprøvning (fase 2) Deling af diagnosekoder via ML																					
Evaluering af pilotforløbet																					

# Tidsplan for pilotafprøvning

- Er der behov for justeringer af tidsplanen?
- Er det evt. muligt for at forlænge pilotafprøvning til august???

# Revideret tidsplan - pr. 02.06.2021

2021	April				Maj				Uge 22	Juni				Juli				Uge 31
Aktivitet/uge	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31
<b>Plan pilotafprøvning</b>														<b>Sommerferie</b>				
Pilotudvikling LPS og PLSP																		
Pilotudvikling Min Læge																		
Indgå aftale med pilotklinikker																		
Egen test Asynkron uploadtest (LPS)																		
Introduktion for pilotklinikker																		
Pilotafprøvning (fase 1) Diagnosekort i praksis																		
Anonymiseret patientdata Downloadtest (ML)																		
Pilotafprøvning (fase 2) Deling af diagnosekoder via ML																		
Evaluering af pilotforløbet																		

# Den videre tidsplan

Delprojekter og faser	2021								2022		Kommentar til justering og aktiviteter
	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Q2	Q3	
											Tidsplan revideret og udvidet med 6 mdr. grundet afventning af OK21 og erkendelse af pilotafprøvning i storskala inden endelig udbredelse i almen praksis.
Workshop											Workshop for delprojekt 2 mhp udarbejdelse af mockup for diagnosekortpakke.
Konceptuel beskrivelse											-
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv.											Udarbejdelse og finjustering af samlet diagnosekortpakke inkl. testprotokol efter workshop, light pilotafprøvning og efter pilotafprøvning i storskala.
Dokumentation PLSP, MinLæge											Workshop og opsamling af dokumentation.
Model og udvikling											
Pilotafrøvning LPS (PLSP og MinLæge)											Start af pilotafrøvning (light) 27. maj - 3. juli 2021
Evaluering											Evaluering og stillingtagen til resultater i den lægefaglige referencegruppe.
Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m											Inddragelse af lægefaglige ambasadører, DKO'er, m.m. i udarbejdelse af faglig dokumentation, support, kurser, lægedage, mv.
Pilotafrøvning i storskala											Start af pilotafrøvning (storskala - 500 klinikker?) 1. september - 30. november 2021
Test og godkendelse											Testcamp 2022 - endelig materiale framsendes senest 1. december 2021.
Udbredelse											National udbredelse af diagnosekort i almen praksis og deling med patient pr 1. juni 2022.
Model og plan											Model, plan og arkitektur for deling af aktuelle og relevante diagnosekoder fra almen praksis.
Proof of concept											Det skal drøftes med PLSP, om det er muligt at afholde et reelte eller kun teoretisk POC.



# Eventuelt og næste møde

## Eventuelt

PLO og MedCom ønsker at modtage LPS's vejledninger for Diagnosekort.

## Næste møde

*Onsdag den 30. juni kl 13:00-15:00*
